


**工程施工查核缺失改善對策及結果表**

標案名稱：○○○○線路土建統包工程（瀝青混凝土路面路肩高程低於排水溝蓋面缺失改善範例）

查核日期：00 年 00 月 00 日

第 00 頁共 00 頁


| 缺點事項                       | 改善對策及結果<br>(附佐證文件及照片請註明)  | 完成日期 | 備註<br>(未完成者請說明) |
|----------------------------|---|------|-----------------|
| 瀝青混凝土路面路肩高程低於排水溝蓋面，不利橫向排水。 | <p>一、原因分析：<br/>緊鄰道路邊溝部分刨除機無法有效刨除，致使後續於路肩部分鋪設瀝青混凝土路面時低於排水溝。</p> <p>二、矯正措施：<br/>以人工加鋪瀝青混凝土並以小型夯實機夯實平整以利橫向排水。</p> <p>三、預防對策：<br/>爾後瀝青混凝土鋪設時如遇路肩無法以鋪裝機鋪設時，承商必須加強以人工輔以小型夯實機壓實平整。</p> |      |                 |

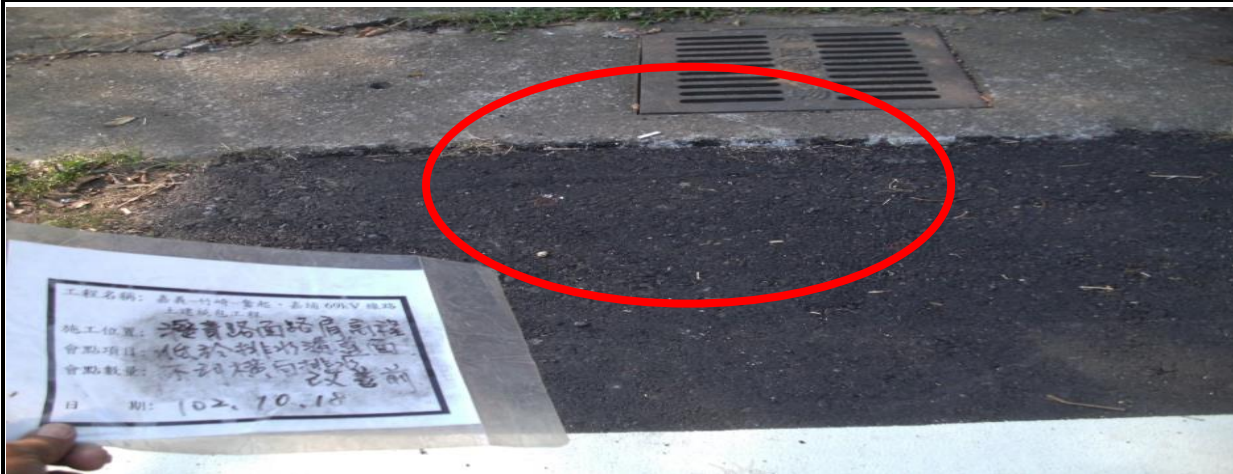

說明：  
**(改善前)**  
路肩高程低於排水溝蓋面



說明：  
**(改善中)**  
路肩高程低於排水溝蓋面鋪平中

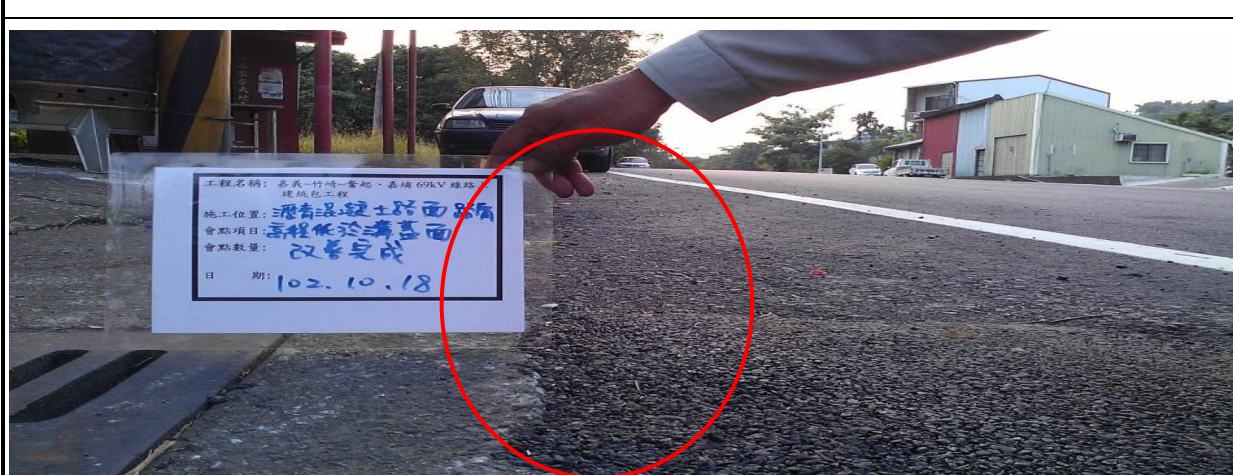

說明：  
**(改善後)**  
路肩高程低於排水溝蓋面已鋪平

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

