

# 經濟部組織改造資訊分組作業推動計畫

## 壹、緣起

為推動本部組織改造資訊分組各項工作之規劃、協調及執行作業，特訂定本推動計畫。

## 貳、策略目標

- 一、配合行政院組織改造資訊分組時程，於 100 年 12 月 31 日前完成各機關資訊移轉整合相關工作。
- 二、於各資訊組織與業務調整變動過程中，以「服務不中斷」最高指導原則，促使新舊機關間資訊系統無縫接軌。

## 參、任務

- 一、本部組改資訊分組相關重要政策討論與決定。
- 二、本部組改資訊分組配套工作之協商
- 三、本部組改資訊分組各項工作進程之督考。

## 肆、推動組織及運作

### 一、組織架構及成員：

(一) 為推動資訊改造各項作業，成立「經濟部組織改造資訊工作小組」，設置組長 1 名，由本部資訊中心主任擔任組長，下設 10 個工作分組及行政辦公室，成員包括本部資訊中心、商業司、所屬機關資訊權責單位，組織架構圖及成員名單詳如附件 1 及附件 2)。

(二) 各分組任務說明如下：

1. 部本部分組：負責本部資訊中心、投資審議委員會、貿易調查委員會、專業人員研究中心、中部辦公室之各項資訊移轉整合工作。
2. 國際貿易局分組：負責國際貿易局之各項資訊移

轉整合工作。

3. 工業局分組：負責工業局之各項資訊移轉整合工作。
4. 中小企業處分組：負責中小企業處之各項資訊移轉整合工作。
5. 標準檢驗局分組：負責標準檢驗局之各項資訊移轉整合工作。
6. 智慧財產局分組：負責智慧財產局之各項資訊移轉整合工作。
7. 能源局分組：負責能源局之各項資訊移轉整合工作。
8. 加工出口區管理處分組：負責加工出口區管理處之各項資訊移轉整合工作。
9. 國營事業委員會分組：負責國營事業委員會之各項資訊移轉整合工作。
10. 商業司分組：負責商業司之各項資訊移轉整合工作。
11. 行政辦公室：負責資訊改造相關幕僚作業。

(三) 本工作小組俟「經濟及能源部」組織法案經行政院審查通過後，將改設為「經濟及能源部籌備小組資訊改造分組」，各工作分組則以本部新機關為名。

## 二、運作方式：

- (一) 本工作小組會議由組長召集之，邀請與議案有關分組及單位參加。
- (二) 本工作小組原則上每一個月召開會議一次，並得視需要隨時召開；另各分組亦可依業務需要自行召開分組會議檢討各項作業並進行橫向連繫協調工作。

## 伍、作業時程

配合行政院組織改造資訊分組時程，於 100 年 12 月 31 日前完成各機關資訊移轉及整合工作，作業時程詳如下表：

作業項目	工作項目	完成日期	負責單位	查核點
一、資訊組織調整規劃作業	1. 提報現行各機關資訊組織人力資源調查清冊	99. 7. 30	現行各機關	99. 7. 20
	2. 提報各新主政機關資訊單位及先期建置階段任務小組清冊	99. 7. 30	各新機關主政單位	99. 7. 20
	3. 提報各新機關資訊單位之處務規程或辦事細則	99. 8. 31	各新機關主政機關	99. 8. 21
二、資訊計畫調整規劃作業	1. 盤點資訊個案計畫及提報「資訊個案計畫清冊及移轉表」	99. 7. 30	現行各機關	99. 7. 20
	2. 彙總整併機關之「資訊個案計畫清冊及移轉表」	99. 8. 31	各新機關主政單位	99. 8. 21
三、資訊作業調整規劃作業	1. 成立組織改造資訊工作小組	99. 7. 1	部本部及各機關	99. 6. 21
	2. 訂立資訊作業執行順序評估準則	99. 9. 1	各新機關主政單位	99. 8. 21
	3. 訂定查核準則及指標	99. 9. 1	各新機關主政單位	99. 8. 21
	4. 擬訂資訊作業調整工作計畫主內容	99. 9. 1	各新機關主政單位	99. 8. 21
	5. 擬訂網路移轉細部計畫、對外網站移轉細部計畫、資訊系統移轉細部計畫、資訊資產移轉細部計畫及資料庫與電子檔移交細部計畫	99. 12. 1	各新機關主政單位	99. 11. 21

作業項目	工作項目	完成日期	負責單位	查核點
	6. 成立新機關籌備小組資訊改造分組	99.12.31	各新機關主政單位	99.12.21
	7. 持續檢討資訊作業調整工作計畫	100.12.31	各新機關主政單位	每次工作小組會議
	8. 舉辦第一次工作計畫重要資訊調整項目演練作業	100.7.1	各新機關主政單位	99.6.21
	9. 舉辦第二次工作計畫重要資訊調整項目演練作業	100.11.1	各新機關主政單位	99.10.21

#### 陸、廣宣作業

- 一、預定於明（100）年於本部全球資訊網站設立本部「組織改造專區」，提供民眾申辦事項、服務電話、辦公地點及業務異動等指引資訊。
- 二、本專區由本部資訊中心提供平台及資料上載機制，各新機關主政單位配合上述相關資訊之上載及更新作業。

#### 柒、管考作業

- 一、列管週期：自 99 年 8 月份起按月追蹤檢討，將各次會議追蹤事項納入
- 二、控管，格式詳「本部組織改造資訊工作小組」列管事項追蹤管控表（詳如附件 3）。
- 三、管考範圍：本工作小組主席裁示事項、各工作分組作業計畫辦理情形及重點項目查核。


#### 捌、實施期間

自核定日起至組織改造完成日。

## 玖、附則

本計畫內容得視行政院、本部所訂相關配套作業規範進行修訂。

## 本部組織改造資訊工作小組架構

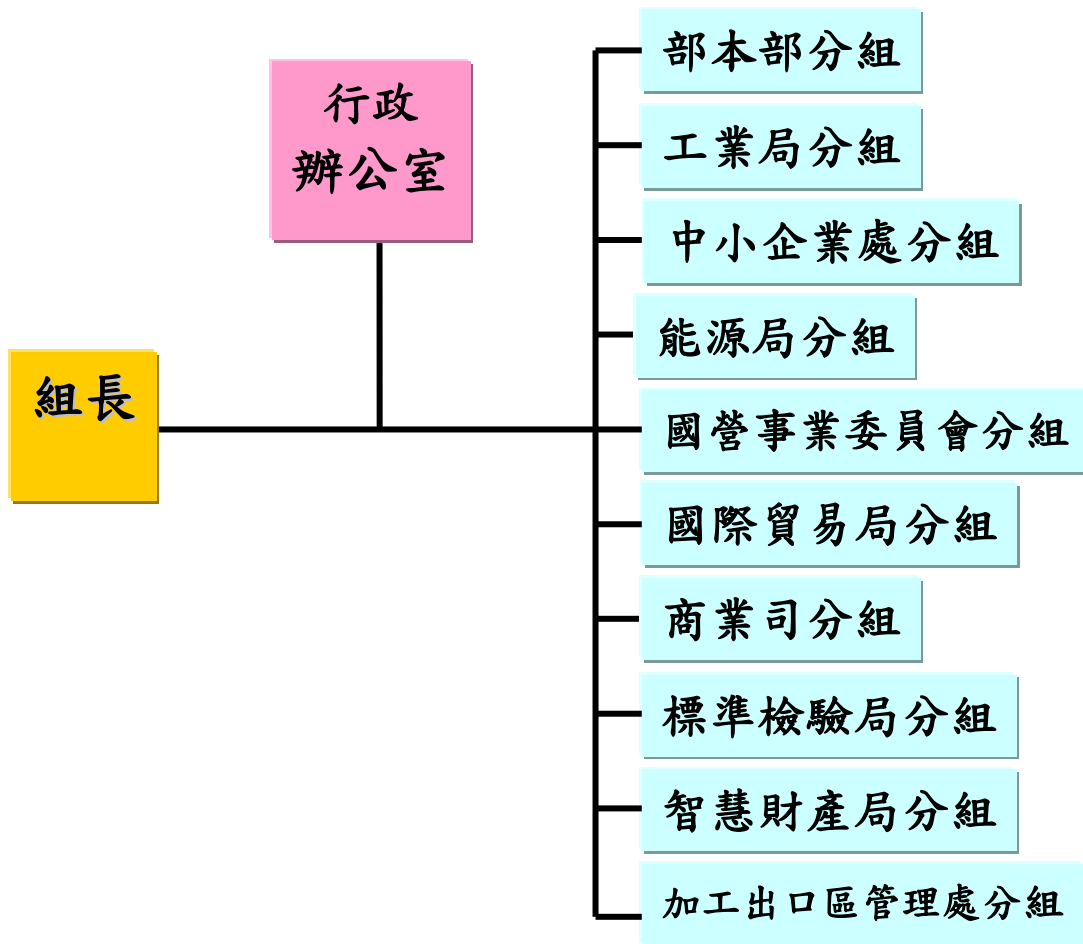

附件 2

## 本部組織改造資訊工作小組成員名單

分組名稱	職務	姓名	職稱
工作小組	小組組長	馬正維	代主任
部本部分組	分組組長	袁國鶯	組長
部本部分組	組員	王松琴	系統分析師
部本部分組	組員	李月霞	系統分析師
部本部分組	分組組長	陳德隆	組長
部本部分組	組員	施佳伶	程式設計師
部本部分組	組員	林淑媛	技士
部本部分組	分組組長	余宗堯	組長
部本部分組	組員	游振東	程式設計師
部本部分組	組員	唐永杰	程式設計師
部本部分組	分組組長	黃嘉琳	組長
部本部分組	組員	鄭韻琳	系統分析師
部本部分組	組員	施元霖	程式設計師
部本部分組(中辦)	組員	鄧錫純	聘用管理師
部本部分組(專研中心)	組員	范振榮	資料編輯師
部本部分組(貿委會)	組員	郭妙蓉	視察
部本部分組(投審會)	組員	蘇琪彥	編審
國營事業委員會分組	分組組長	鄭春光	科長
國營事業委員會分組	組員	薛永福	系統分析師
國營事業委員會分組	組員	陳建興	電腦工程師
工業局分組	分組組長	吳瑞琦	主任
工業局分組	組員	黃漢釗	技正
工業局分組	組員	黃祈雄	研究員
國際貿易局分組	分組組長	汪其芬	主任
國際貿易局分組	組員	林美綉	副執行秘書
國際貿易局分組	組員	王瑰瑋	系統分析師
國際貿易局分組	組員	金燁燁	系統分析師
商業司分組	分組組長	陳佩君	專員

分組名稱	職務	姓名	職稱
商業司分組	組員	徐露翠	約聘
商業司分組	組員	李美琦	約僱
智慧財產局分組	分組組長	謝淑姿	科長
智慧財產局分組	組員	侯鈴瑛	科長
智慧財產局分組	組員	林聰仁	分析師
智慧財產局分組	組員	劉芳遠	科長
智慧財產局分組	組員	李楷元	科長
標準檢驗局	分組組長	林兆任	主任
標準檢驗局	組員	林恒意	科長
標準檢驗局	組員	陳麗美	科長
中小企業處	分組組長	謝月媚	技正
中小企業處	組員	林純倩	約聘設計師
加工出口區管理處分組	分組組長	彭群超	科長
加工出口區管理處分組	組員	歐立惠	約聘人員
加工出口區管理處分組	組員	賴蘊真	約聘人員
能源局分組	分組組長	韋潤生	科長
能源局分組	組員	戴家水	技正
能源局分組	組員	張雅惠	技正
行政辦公室		柯雅娟	技正
行政辦公室		曾志明	程式設計師



附件 3

「經濟部組織改造資訊工作小組」列管事項追蹤管控表

彙辦時間：99.07.

項次	列管事項	主辦單位	辦理情形	預定完成時間 (查核點、%)	列管建議	備註
